

Stato attuazione interventi post frana e post sisma



Aggiornamento: 1 marzo 2024





Piano interventi ODPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA





	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-0-001	Casamicciola Terme	Assistenza operatori	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	100.000,00 €	100
CD-CT-0-003	Casamicciola Terme	Delimitazione della sede viaria, 1°disgaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla frana in direz Lacco	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	300.000,00 €	100
CD-CT-0-005	Casamicciola Terme	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 28+800., rimozione rete, taglio arbusti, disgaggio parti di costone, rimozione materiale accumulato /detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte della scarpata.	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	30.000,00 €	100
CD-CT-0-006	Casamicciola Terme	Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	15.000,00 €	100
CD-CT-1-001	Casamicciola Terme	Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/2	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	2.000.000,00 €	100
CD-CT-1-002	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora.	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.300.000,00 €	30
CD-CT-1-003	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di versante sovrastante l'Alveo Negrofonte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un'altezza media di mt 17,00. - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	975.858,00 €	50



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA




	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-004	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso lavori	2.314.695,91 €	30
CD-CT-1-005	Casamicciola Terme	Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia- Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) -Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arred	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	1.170.000,00 €	50
CD-CT-1-009	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso lavori	87.206,98 €	50
CD-CT-1-010	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella	SMA Campania Spa	In corso lavori	116.267,77 €	10
CD-CT-1-011	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un'altezza media di circa mt. 10,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso lavori	665.659,56 €	10
CD-CT-1-012	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo stimato di € 105.850,00 - Via Mortito	SMA Campania Spa	Da avviare	1.420.000,00 €	0
CD-CT-1-015	Casamicciola Terme	Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	10.506,64 €	100
CD-CT-1-016	Casamicciola Terme	Intervento di ricostruzione muro di contenimento alla strada via Celario (oltre frana)	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	350.000,00 €	10



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-017	Casamicciola Terme	Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'Alveo Torrente Cuccufreddo, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed un'altezza media di circa mt 3,00	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	850.000,00 €	10
CD-CT-1-019	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	In corso Lavori	560.000,00 €	55
CD-CT-1-020	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	89.198,65 €	100
CD-CT-1-021	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	258.048,71 €	100
CD-CT-1-022	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	309.706,59 €	100
CD-CT-1-023	Casamicciola Terme	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	SMA Campania Spa	Eseguito	262.853,99 €	100
CD-CT-1-024	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza ripristino ed implementazione impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz -	EVI	Eseguito	200.000,00 €	100



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-025	Casamicciola Terme	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina -	EVI	Eseguito	40.639,82 €	100
CD-CT-1-026	Casamicciola Terme	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque ss270 e piazza marina - Primi interventi di messa in sicurezza	EVI	Eseguito	228.000,00 €	100
CD-CT-1-027	Casamicciola Terme	Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito - captazione acque da Monte Tabor -	EVI	In corso Progettazione	200.000,00 €	5
CD-CT-1-028	Casamicciola Terme	Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	80.000,00 €	50
CD-CT-1-029	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	400.000,00 €	15
CD-CT-1-030	Casamicciola Terme	Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle acque	Commissario Delegato - Comune di Casamicciola Terme (realizzazione lavori)	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	1.750.000,00 €	5



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-032	Casamicciola Terme	Disgaggio massi pericolanti e rimozione materiali località Celario	SMA Campania Spa	In corso Lavori	3.927.738,07 €	70
CD-CT-1-034	Casamicciola Terme	Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	15.000,00 €	5
CD-CT-1-035	Casamicciola Terme	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	180.000,00 €	10
CD-CT-1-036	Casamicciola Terme	fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisoria e di emergenza (transenne, coni, semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	150.000,00 €	10
CD-CT-1-037	Casamicciola Terme	intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi danneggiati	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	85.000,00 €	100
CD-CT-1-038	Casamicciola Terme	intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera - Eliporto)	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	2.000.000,00 €	10
CD-CT-1-039	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	40.478,51 €	50
CD-CT-1-040	Casamicciola Terme	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	Commissario Delegato	In corso Lavori	1.900.000,00 €	50



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-041	Casamicciola Terme	Rimozione materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc. (via Vittorio Emanuele)	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	750.000,00 €	0
CD-CT-2-045	Casamicciola Terme	Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi", in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina è divenuta inagibile ed è stato preso in locazione l'ex Convento in via S. Gllardi - Piazza Marina	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	20.000,00 €	0
CD-CT-2-046	Casamicciola Terme	Esecuzione Cassoni località Celario	Commissario delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	1.347.049,30 €	5
CD-CT-2-047	Casamicciola Terme	Rimozione rifiuti Cava Pozzillo	Commissario delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	1.168.798,10 €	5
CD-CT-2-048	Casamicciola Terme	Ripristino dell'Alveo Celario da quota sul liv m circa 300 m fino alla sezione di imbocco di Cava Fontana e altri interventi di completamento	Commissario Delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	2.000.000,00 €	5
CD-CT-3-048	Casamicciola Terme	Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco cava Fontana) II fase	Commissario delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	2.000.000,00 €	5
CD-CT-2-049	Casamicciola Terme	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade/Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.400.000,00 €	5
CD-CT-2-053	Casamicciola Terme	Ripristino dell'officiosità idraulica	Commissario delegato	Da avviare	800.000,00 €	0



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Lacco Ameno

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-LA-0-001	Lacco Ameno	Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	43.458,83 €	100
CD-LA-0-002	Lacco Ameno	Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	63.215,50 €	100
CD-LA-0-003	Lacco Ameno	Opere di pulizia e accantonamento del materiale che ostruisce la viabilità e opere di transennamento per garantire la pubblica e privata incolumità	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	31.909,59 €	100
CD-LA-0-004	Lacco Ameno	Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergio del muro stradale	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	30.000,00 €	100
CD-LA-0-005	Lacco Ameno	Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	1.000,00 €	100
CD-LA-1-001	Lacco Ameno	Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato	Comune di Lacco Ameno	In corso Lavori	260.000,00 €	90
CD-LA-1-002	Lacco Ameno	Ispezioni puntuali del costone, disaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	10.614,00 €	100
CD-LA-1-003	Lacco Ameno	Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	12.487,24 €	100
CD-LA-1-005	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico - Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	229.500,00 €	5
CD-LA-1-006	Lacco Ameno	Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico -Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	109.700,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-LA-1-007	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale - Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	148.500,00 €	5
CD-LA-1-008	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale - Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	50.300,00 €	0
CD-LA-1-009	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incumbente su via Casamonte, vico I Torre, vico II Torre	Comune di Lacco Ameno /Commissario Delegato	In corso progettazione	500.000,00 €	0
CD-LA-1-014	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento su via Rosario	Comune di Lacco Ameno	Da avviare	45.000,00 €	0
CD-LA-1-017	Lacco Ameno	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Città Metropolitana	Da avviare	300.000,00 €	0
CD-LA-2-018	Lacco Ameno	Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria a causa della sovrappressione idraulica causata dall'evento calamitoso	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	200.000,00 €	10
CD-LA-2-019	Lacco Ameno	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Città Metropolitana /Casamicciola T.	In corso Progettazione	600.000,00 €	5
CD-LA-2-020	Lacco Ameno	Ripristino della funzionalità della rete fognaria bianca e nera	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	590.000,00 €	10
CD-LA-2-021	Lacco Ameno	Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	320.000,00 €	10
CD-LA-2-022	Lacco Ameno	Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie bianche e nere	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	250.000,00 €	10
CD-LA-2-023	Lacco Ameno	Pulizia e ripristino della fogna pluviale in via Montevico	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	200.000,00 €	10



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-FO-0-001	Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Eseguito	20.544,80 €	100
CD-FO-0-002	Forio	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Eseguito	12.200,00 €	100
CD-FO-0-005	Forio	INTERDIZIONE SEDE STRADALE CON IDONEE DELIMITAZIONI	Comune di Forio	Eseguito	6.100,00 €	100
CD-FO-0-006	Forio	CUCI E SCUCI DELLA MURATURA ESISTENTE	Comune di Forio	Eseguito	7.200,00 €	100
CD-FO-0-007	Forio	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E RICOSTRUZIONE SEZIONE CANALE	Comune di Forio	Eseguito	3.660,00 €	100
CD-FO-0-008	Forio	RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA E RIPRISTINO SEDE STRADALE	Comune di Forio	Eseguito	4.500,00 €	100
CD-FO-0-009	Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Eseguito	25.000,00 €	100
CD-FO-0-010	Forio	RILIEVO DEI DISSESTI FRANOSI CON GEOREFERENZIAZIONE, RAPPORTO DESCRITTIVO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO SULLE TENDENZE EVOLUTIVE GENERALI	Comune di Forio	Eseguito	10.000,00 €	100
CD-FO-0-011	Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	30.000,00 €	0
CD-FO-1-001	Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	In corso Lavori	68.000,00 €	5



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-FO-1-002	Forio	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI	Comune di Forio	Eseguito	185.000,00 €	100
CD-FO-1-003	Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA	Comune di Forio	Eseguito	735.000,00 €	100
CD-FO-1-005	Forio	PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA	Comune di Forio	In corso Progettazione	191.000,00 €	5
CD-FO-1-006	Forio	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI -Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	800.000,00 €	15
CD-FO-1-008	Forio	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Eseguito	156.000,00 €	100
CD-FO-1-009	Forio	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE - Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Da avviare	200.000,00 €	0
CD-FO-1-010	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO -CAVA CAMPO - primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso Progettazione	172.000,00 €	0
CD-FO-1-011	Forio	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO -Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso Lavori	422.000,00 €	30
CD-FO-1-013	Forio	OPERE DIFESA PROVVISORIALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO - stralcio funzionale 1	Comune di Forio	Eseguito	200.000,00 €	100



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-FO-1-015	Forio	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	250.000,00 €	10
CD-FO-2-016	Forio	Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello sport Palacasale	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	98.500,00 €	5
CD-FO-2-017	Forio	opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola	Comune di Forio	In corso Progettazione	90.000,00 €	0
CD-FO-2-018	Forio	taglio vegetazionale, disaggio, stabilizzazione e trasporto dei materiali litoidi e biomasse ai siti	Comune di Forio	In corso Progettazione	1.500.000,00 €	0
CD-FO-2-019	Forio	Opere di difesa provvisoria in attesa intervento definitivo - località Soccorso - stralcio funzionale 3	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	1.465.000,00 €	10
CD-FO-2-020	Forio	Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in località Passavento	Comune di Forio	In corso Progettazione	850.000,00 €	0
CD-FO-2-021	Forio	Opere di pulizia dei fossi di guardia e delle vasche di laminazione ExSS270	Comune di Forio	Da avviare	300.000,00 €	0



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Serrara Fontana

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-SF-0-001	Serrara Fontana	Ex SS 270 - Isola verde, vari tratti sommano ml 100, rimozione materiali e delimitazioni (tra Serrara Fontana e Barano d'Ischia)	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	6.000,00 €	100
CD-SF-0-002	Serrara Fontana	Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione.	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	7.320,00 €	100
CD-SF-0-003	Serrara Fontana	Ripristino tratto di strada crollato	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	5.310,51 €	100
CD-SF-0-004	Serrara Fontana	Sp 202, nei pressi del cimitero di Serrara Fontana, diversi interventi di pulizia della sede viaria comprese griglie	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	2.000,00 €	100
CD-SF-0-005	Serrara Fontana	SP478, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergio della scarpata e delimitazione provvisoria	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	8.000,00 €	100
CD-SF-0-006	Serrara Fontana	Sp 112, rimozione rete, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	4.000,00 €	100
CD-SF-0-007	Serrara Fontana	Sp 112, disaggio e rimozione materiale detritico, oltre alla pulizia della porzione di scarpata interessata.	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	3.000,00 €	100
CD-SF-0-008	Serrara Fontana	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 9+850 , delimitazione	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	2.000,00 €	100



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA




 LAVORI IN CORSO	 PROGETTAZIONE IN CORSO
 CONCLUSO	 DA AVVIARE
 LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG	

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE_INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-SF-1-001	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc.) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.	Comune di Serrara Fontana	In corso Lavori	1.110.000,00 €	10
CD-SF-1-002	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Da avviare	450.000,00 €	0
CD-SF-1-003	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc.) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale Casale. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Da avviare	150.000,00 €	0
CD-SF-1-004	Serrara Fontana	Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	0
CD-SF-1-005	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Traspoto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	100.000,00 €	0
CD-SF-1-006	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	150.000,00 €	0
CD-SF-1-007	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana	In corso Lavori	200.000,00 €	80
CD-SF-1-008	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	200.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-SF-1-009	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	200.000,00 €	0
CD-SF-1-010	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell'Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	400.000,00 €	0
CD-SF-1-011	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	In corso Lavori	200.000,00 €	70
CD-SF-1-012	Serrara Fontana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	100.000,00 €	0
CD-SF-1-013	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	200.000,00 €	0
CD-SF-1-014	Serrara Fontana	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	200.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-SF-1-015	Serrara Fontana	Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc.	Comune di Serrara Fontana	Da avviare	12.500,00 €	0
CD-SF-1-016	Serrara Fontana	sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	400.000,00 €	0
CD-SF-1-017	Serrara Fontana	Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	0
CD-SF-2-019	Serrara Fontana	Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località Fontana	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	1.830,00 €	100
CD-SF-2-020	Serrara Fontana	Lavori di disostruzione della parte terminale dell'alveo di Fondolillo in località Sant'Angelo	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	5.978,00 €	100
CD-SF-2-021	Serrara Fontana	Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Da avviare	1.500.000,00 €	0



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-IS-0-002	Ischia	Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque	Comune di Ischia	Eseguito	653,92 €	100
CD-IS-0-003	Ischia	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Eseguito	1.659,20 €	100
CD-IS-0-004	Ischia	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Eseguito	829,60 €	100
CD-IS-0-005	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.061,40 €	100
CD-IS-0-006	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.415,20 €	100
CD-IS-0-007	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	2.049,60 €	100
CD-IS-0-008	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.238,30 €	100
CD-IS-0-009	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	884,50 €	100
CD-IS-0-010	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	652,70 €	100
CD-IS-0-011	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	2.732,80 €	100
CD-IS-0-012	Ischia	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.146,80 €	100
CD-IS-0-013	Ischia	Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque meteoriche in scadenza il 31.12.2022	Comune di Ischia	Eseguito	12.505,00 €	100
CD-IS-0-014	Ischia	Messa in sicurezza con opere provvisori e ripristino muro di contenimento della strada	Comune di Ischia	Eseguito	36.038,80 €	100
CD-IS-1-002	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Da avviare	115.900,00 €	0
CD-IS-1-003	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls	Comune di Ischia	Da avviare	55.000,00 €	0
CD-IS-1-004	Ischia	rifacimento muro di contenimento in muratura locale	Comune di Ischia	Da avviare	49.000,00 €	0
CD-IS-1-005	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls - I lotto	Comune di Ischia /Commissario Delegato	In corso Progettazione	169.600,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-IS-1-006	Ischia	Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi interventi di riqualificazione e potenziamento	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	106.913,93 €	5
CD-IS-1-007	Ischia	Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Da avviare	1.496.000,00 €	0
CD-IS-1-008	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e primi interventi di regimentazione idraulica per il costone prospiciente il sentiero denominato "Malupass"	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Da avviare	106.000,00 €	0
CD-IS-1-010	Ischia	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato)	EVI	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	300.000,00 €	5
CD-IS-1-012	Ischia	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Da avviare	350.000,00 €	0
CD-IS-1-013	Ischia	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA	Comune di Ischia	In corso Progettazione	460.000,00 €	0
CD-IS-1-015	Ischia	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso TRAVERSA MONTAGNONE	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Eseguito	51.352,75 €	100
CD-IS-1-016	Ischia	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA DELLE VIGNE e denominato CAVONE DEL PANZESE	Comune di Ischia/ Commissario Delegato	Da avviare	250.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE_INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-IS-1-017	Ischia	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA PENDIO DEL LAPILLO	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Eseguito	200.000,00 €	100
CD-IS-1-018	Ischia	manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza - Tenenza di Ischia a seguito degli interventi	Comune di Ischia	In corso Lavori	106.500,00 €	60
CD-IS-1-019	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento	Regione Campania	Da avviare	31.000,00 €	0
CD-IS-1-020	Ischia	Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento armato	Regione Campania	Da avviare	60.000,00 €	0
CD-IS-1-021	Ischia	Lavori di pulizia della vegetazione e disaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del coston	Regione Campania	Da avviare	300.000,00 €	0
CD-IS-1-022	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di conteniment	Regione Campania	Da avviare	120.000,00 €	0
CD-IS-1-023	Ischia	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale	Regione Campania	Da avviare	40.000,00 €	0
CD-IS-2-024	Ischia	Rifacimento muro di contenimento e intervento corticale in Via Cà Mormile	Comune di Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	408.701,76 €	5
CD-IS-2-025	Ischia	interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore	Comune d'Ischia	Da avviare	915.000,00 €	0



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Barano d'Ischia

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-BI-0-001	Barano d'Ischia	Lavori di rimozione di materiale franato - Rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito	Comune di Barano d'Ischia	Eseguito	1.220,00 €	100
CD-BI-0-002	Barano d'Ischia	SP 155, messa in sicurezza provvisoria	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	3.000,00 €	100
CD-BI-1-001	Barano d'Ischia	Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospicienti strade pubbliche	Comune di Barano d'Ischia	Eseguito	5.000,00 €	100
CD-BI-1-002	Barano d'Ischia	Lavori di Rimozione inerti	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	70.000,00 €	0
CD-BI-1-003	Barano d'Ischia	Lavori di Rimozione albero caduto con mezzi meccanici	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	3.000,00 €	0
CD-BI-1-005	Barano d'Ischia	Sistemazione del materiale franato e distaccato	Comune di Barano d'Ischia	In corso Lavori	50.000,00 €	10
CD-BI-1-006	Barano d'Ischia	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Commissario Delegato	In corso Progettazione	700.000,00 €	0
CD-BI-1-007	Barano d'Ischia	Mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti rocciosi prospicienti strada carrabile	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	30.000,00 €	5
CD-BI-1-008	Barano d'Ischia	Mitigazione del rischio con lavori di sistemazione di una porzione dei muri latitanti la strada pubblica via Giorgio Corafà	Comune di Barano d'Ischia	Da avviare	60.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-BI-1-009	Barano d'Ischia	rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	120.000,00 €	0
CD-BI-1-010	Barano d'Ischia	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	180.000,00 €	0
CD-BI-1-011	Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti) fase 1	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	80.000,00 €	0
CD-BI-1-012	Barano d'Ischia	Pulizia delle rete paramassi pre-esistenti - Maronti	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	800.000,00 €	5
CD-BI-1-013	Barano d'Ischia	Lavori volti all'eliminazione del rischio presso l'Alveo Cava Zaffarano-Prima pulizia di un tratto	Commissario Delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	820.000,00 €	0
CD-BI-1-014	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso il canale Spigadosso	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	456.000,00 €	5
CD-BI-1-015	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso Cava Pallarito	Commissario Delegato	In corso Lavori	70.000,00 €	5
CD-BI-1-016	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la Pubblica via Cufa	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	100.000,00 €	0
CD-BI-1-017	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la strada Pubblica P.Le Cretaio	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	100.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA






	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE_INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-BI-1-018	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la Via Chiummano	Commissario Delegato	Da avviare	170.000,00 €	0
CD-BI-1-019	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni dei cavoni	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	200.000,00 €	0
CD-BI-1-020	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la Via Vecchia Pallarito	Commissario Delegato	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	70.000,00 €	5
CD-BI-1-021	Barano d'Ischia	SP143, messa in sicurezza provvisoria	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	5.000,00 €	100
CD-BI-1-022	Barano d'Ischia	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade / Strutt. Commissariale	Da avviare	140.000,00 €	0
CD-BI-1-023	Barano d'Ischia	Rimozione materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc.	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	200.000,00 €	0
CD-BI-1-024	Barano d'Ischia	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	200.000,00 €	0
CD-BI-1-025	Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei muri latitanti la strada pubblica via Pendio del Gelso	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	250.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		


CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-BI-2-026	Barano d'Ischia	Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto	Comune di Barano d'Ischia	Da avviare	100.000,00 €	0
CD-BI-2-027	Barano d'Ischia	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Da avviare	1.610.000,00 €	0
CD-BI-2-028	Barano d'Ischia	Lavori vdi messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strada pubblica Via Benedetto Migliaccio	Comune di Barano d'Ischia	Da avviare	1.150.000,00 €	0
CD-BI-2-029	Barano d'Ischia	Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Michelangelo	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	Da avviare	1.100.000,00 €	0
CD-BI-2-030	Barano d'Ischia	lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada P.le Via Duca degli Abruzzi	Comune di Barano d'Ischia	Da avviare	800.000,00 €	0
CD-BI-2-031	Barano d'Ischia	Pulizia rete paramassi preesistente con opere di manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento presso la spiaggia dei Maronti	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	300.000,00 €	0
CD-BI-2-032	Barano d'Ischia	Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano	Comune di Barano d'Ischia	Da avviare	200.000,00 €	0

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-IS-O-001	Tutti i comuni dell'isola	Ex SS 270 - Isola verde, + SP ricadenti sull'isola d'Ischia	Città metropolitana	Eseguito	20.000,00 €	100



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Sintesi interventi Piano di Protezione Civile

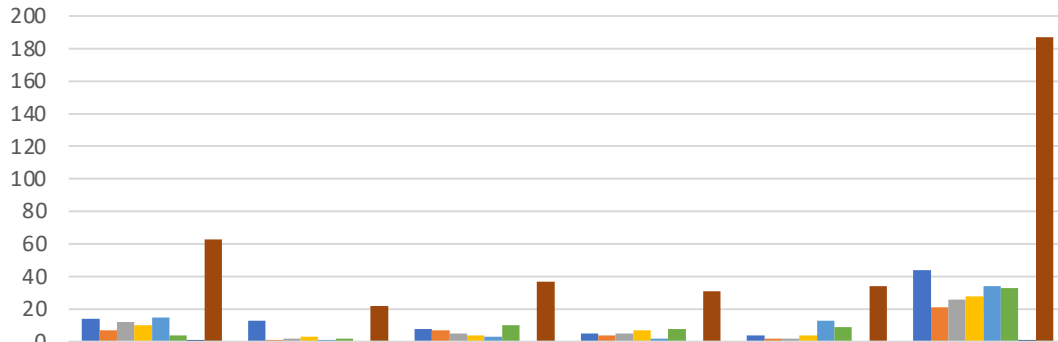


	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	In fase progettuale	Da avviare	Totale
Casamicciola Terme	14	13	8	5	4	44
Lacco Ameno	7	1	7	4	2	21
Forio	12	2	5	5	2	26
Serrara Fontana	10	3	4	7	4	28
Ischia	15	1	3	2	13	34
Barano d'Ischia	4	2	10	8	9	33
Tutti i comuni dell'isola	1					1
TOTALE	63	22	37	31	34	187

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi del Piano di Protezione Civile ripartiti per comune di ubicazione

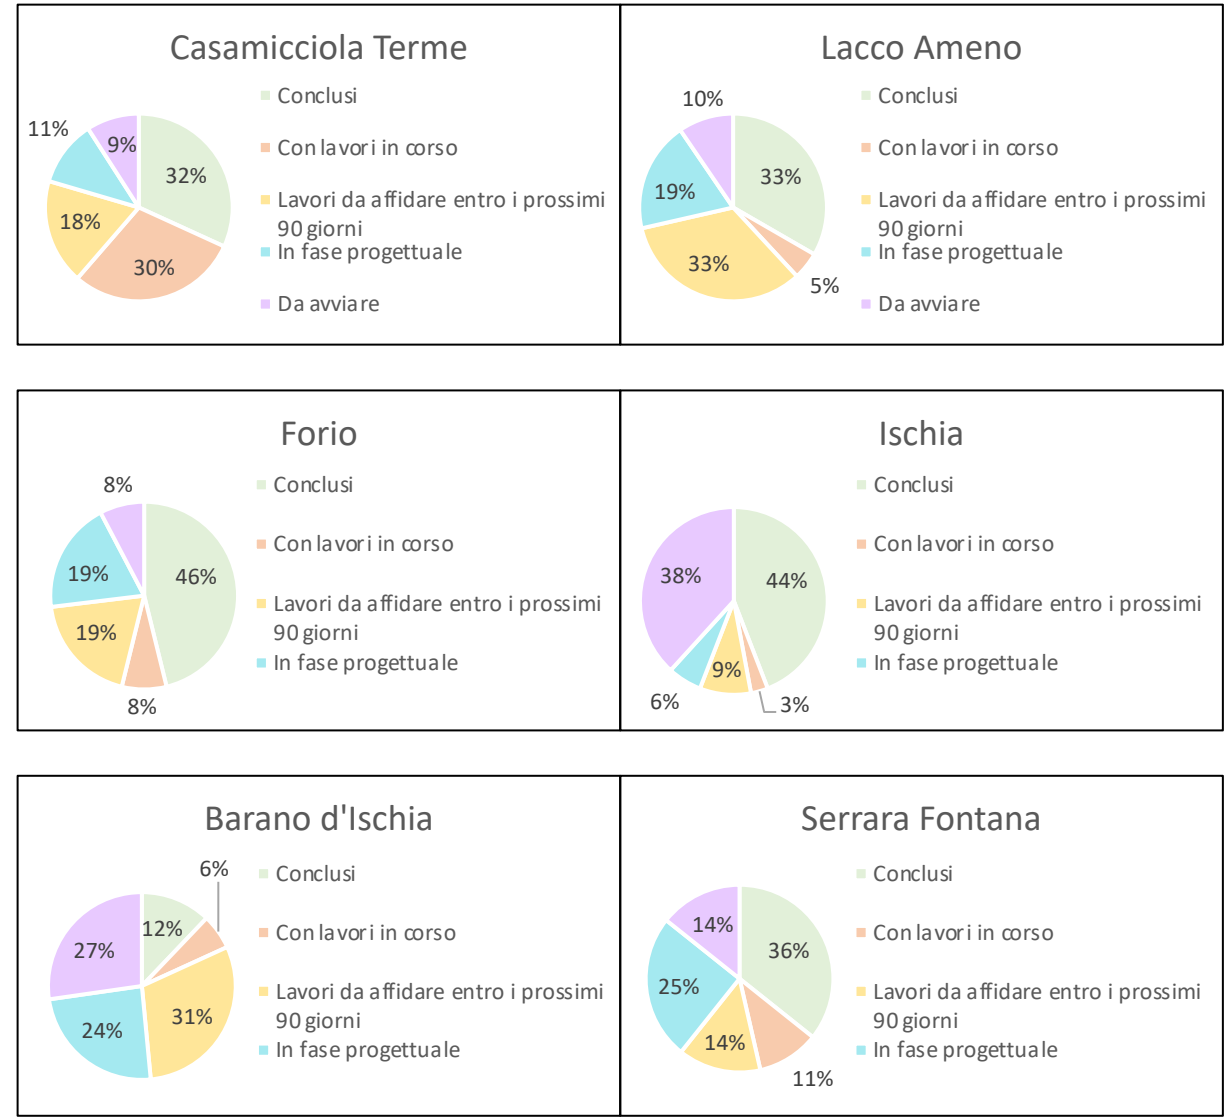




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

TABELLA A – Soggetto attuatore degli interventi che si trovano allo stato "da avviare"												
Interventi Piano di Protezione Civile	Commissario Delegato	Regione Campania	Comune di Serrara Fontana	Comune di Lacco Ameno	Comune di Ischia	Comune di Forio	Comune di Casamicciola Terme	Comune di Barano	SMA Campania	Città Metropolitana	TOTALE	
	Casamicciola Terme	1*					2		1		4	
	Lacco Ameno			1						1	2	
	Forio					2					2	
	Serrara Fontana			3						1	4	
	Ischia	1	5			7					13	
	Barano d'Ischia	1						7		1	9	
	TOTALE	3	5	3	1	7	2	2	7	1	3	34
	* intervento che sarà eliminato con la terza rimodulazione											

Soggetto attuatore degli interventi che si trovano allo stato "da avviare"

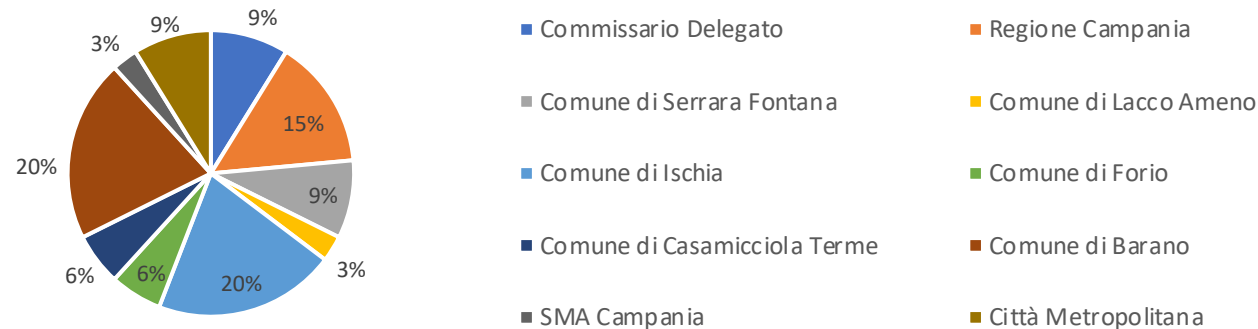


In Tabella A, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli Enti Soggetti attuatori titolari di interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «Da avviare», ossia per i quali deve ancora essere redatto il DIP e che, pertanto, non hanno avviato la progettazione. Un terzo circa di tali interventi sono stati assegnati solo con l'ultima rimodulazione del dicembre 2023.



TABELLA B – Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione"

	Interventi in prima fase procedura (Redazione DIP / Affidamento SIA)	Progettazione in corso	TOTALE interventi nello stato "In corso Progettazione"
Casamicciola Terme	2	3	5
Lacco Ameno	1	3	4
Forio		5	5
Serrara Fontana	7		7
Ischia	2		2
Barano d'Ischia	4	4	8
TOTALE	16	15	31

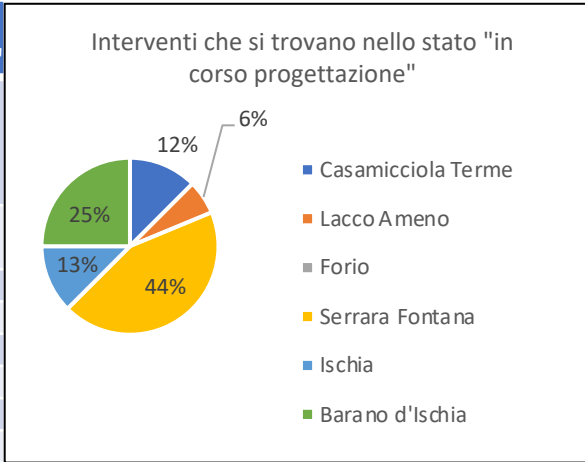


In Tabella B, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «In corso progettazione». Sono stati suddivisi in due sottogruppi, a seconda che la progettazione sia stata solo assegnata e, pertanto sia appena cominciata, o che sia ad uno stato avanzato di redazione, benchè non ancora completata.

In Tabella C, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «in corso progettazione», ma che sono nelle condizioni di andare a gara o di iniziare i lavori entro i prossimi 90 giorni.

TABELLA C – Soggetto attuatore degli Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione" che andranno a gara o inizieranno i lavori entro 90 giorni

	Commissario Delegato	EVI	Comune di Serrara Fontana	Comune di Lacco Ameno	Comune di Ischia	Comune di Forio	Comune di Casamicciola Terme	Comune di Barano	Città Metropolitana	TOTALE
Casamicciola Terme	5						3			8
Lacco Ameno		5		1					1	7
Forio						5				5
Serrara Fontana			4							4
Ischia		2			1					3
Barano d'Ischia	2							8		10
TOTALE	7	7	4	1	1	5	3	8	1	37

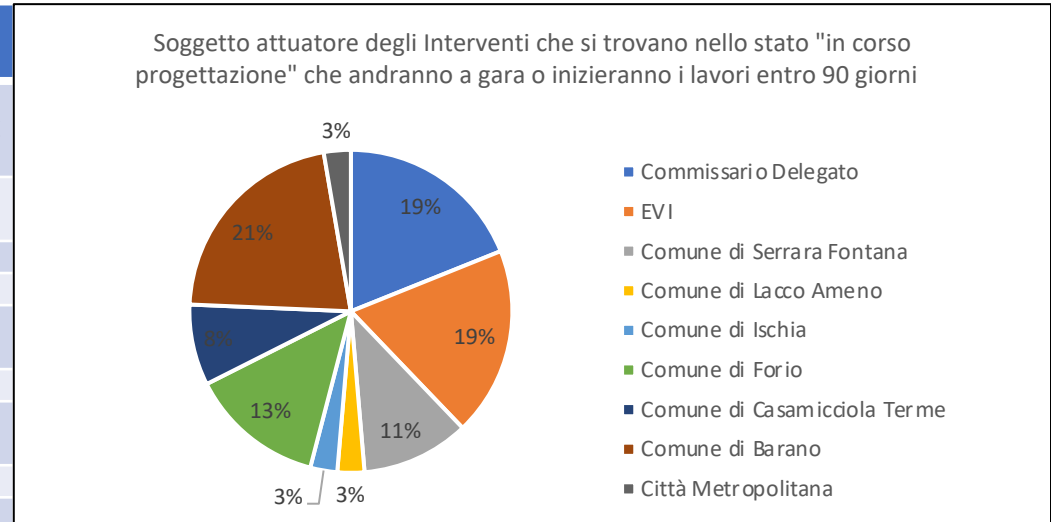



Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		


CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-F-040	Casamicciola Terme	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	Eseguito	3.781.904,97 €	100
CD-CT-F-041	Casamicciola Terme	Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti	SMA Campania Spa	In corso Lavori	4.885.482,24 €	60
CD-CT-F-042	Casamicciola Terme	Ulteriore Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	In corso Lavori	2.000.000,00 €	95
CD-CT-F-052	Casamicciola Terme	ULTERIORE PULIZIA E DISSABBIAMENTO ALVEO TOMBATO TERMINALE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA	EVI	In corso Progettazione	162.226,05 €	0
CD-CT-F-043	Casamicciola Terme	Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell'alveo tombato "Pio Monte della Misericordia" lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia	EVI	Eseguito	258.323,51 €	100
CD-CT-F-044	Casamicciola Terme	Pulizia e disabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata "Rittmann" nonché del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina	EVI	Da avviare	21.773,95 €	0
CD-CT-F-050	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita	Commissario straordinario	Eseguito	810.000,00 €	100
CD-CT-F-051	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco	Commissario straordinario	In corso Lavori	900.000,00 €	80
CD-LA-F-028	Casamicciola Terme/Lacco Ameno/Forio	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco	Commissario straordinario	In corso Lavori	290.000,00 €	65
CD-CT-F-053-A	Casamicciola Terme	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (1° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.191.784,11 €	0
CD-CT-F-053-B	Casamicciola Terme	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (2° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.229.743,57 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

Comune di Casamicciola Terme

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-F-021	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	214.138,31 €	100
CD-CT-F-022	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	267.961,63 €	100
CD-CT-F-023	Casamicciola Terme	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	SMA Campania Spa	Eseguito	222.334,05 €	100

Comune di Forio

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-FO-F-022	Forio	Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano attrezzato e delle opere complementari	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	2.619.266,62 €	0


Comune di Lacco Ameno

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-LA-F-024	Lacco Ameno	Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DN500	EVI	Eseguito	286.788,03 €	100
CD-LA-F-025	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella mc30	EVI	Eseguito	49.117,20 €	100
CD-LA-F-026	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" località Capitello	EVI	Eseguito	338.176,63 €	100
CD-LA-F-027	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo limitrofo denominato "La Rita"	EVI	In corso Lavori	470.979,12 €	30



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Piano fanghi – Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

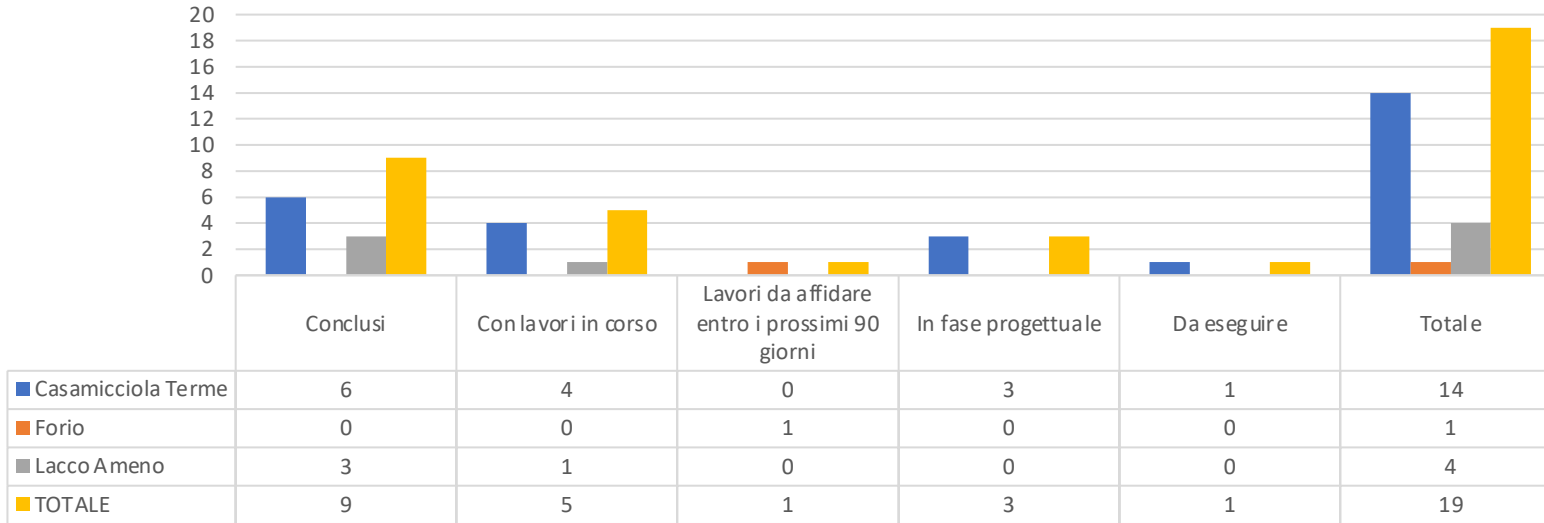




LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		



SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi «Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 e ripartiti per comune di ubicazione

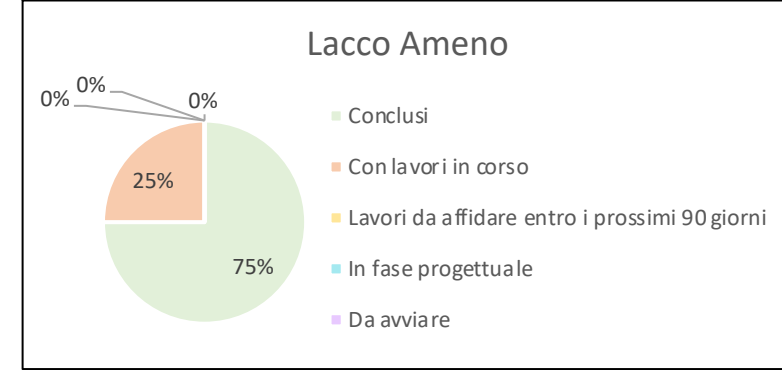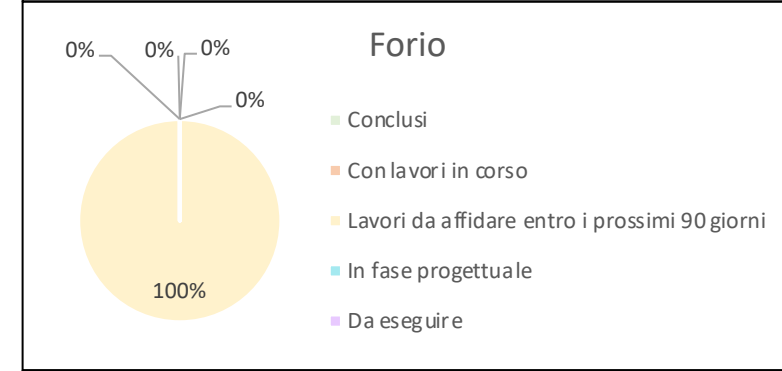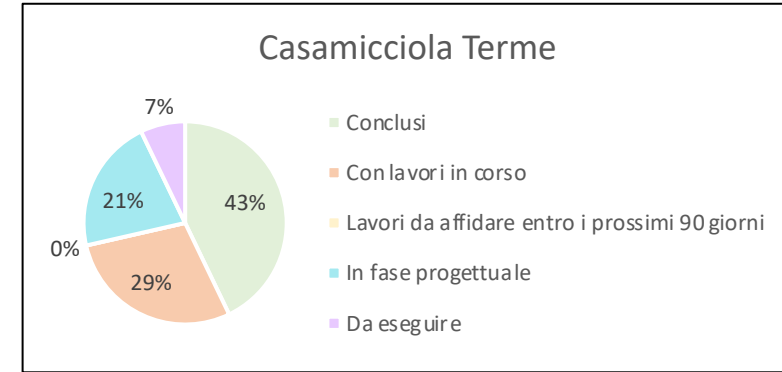

Ischia, 01/03/2024



Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania



STATO DI ATTUAZIONE

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA



CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-1-006	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed un'altezza di circa mt 40,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	583.095,62 €	30
CD-CT-1-007	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un'altezza di mt 40,00 - Primi interventi	SMA Campania Spa	In corso Lavori	547.000,00 €	80
CD-CT-1-008	Casamicciola Terme	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	848.000,00 €	50
CD-CT-1-031	Casamicciola Terme	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte di liquefazione e colata conseguente agli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 mediante dragaggio del porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna	Lacco Ameno Capofila dei comuni dell'isola d'Ischia	Eseguito	3.212.000,00 €	100

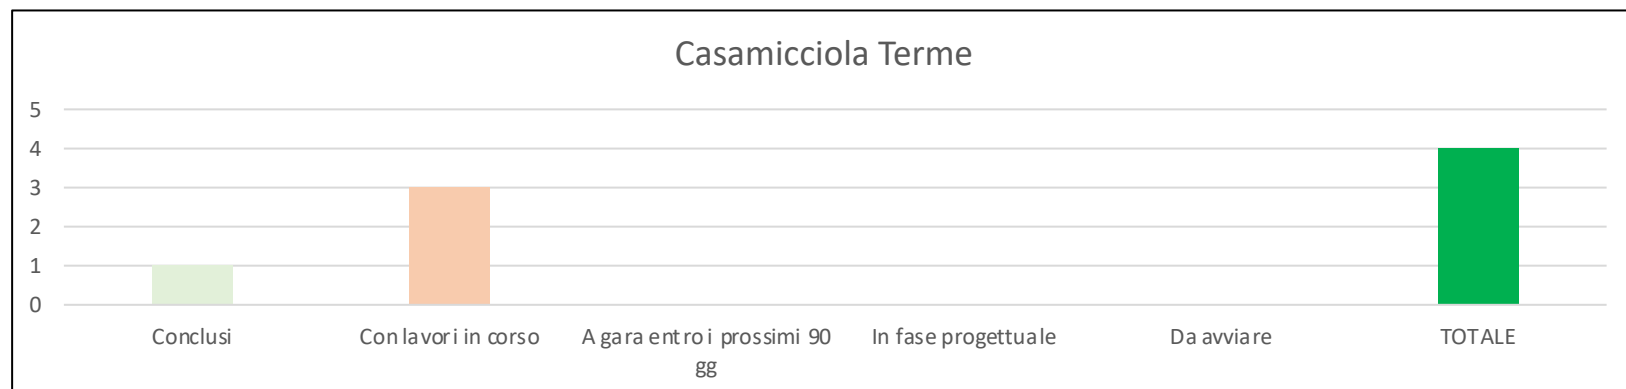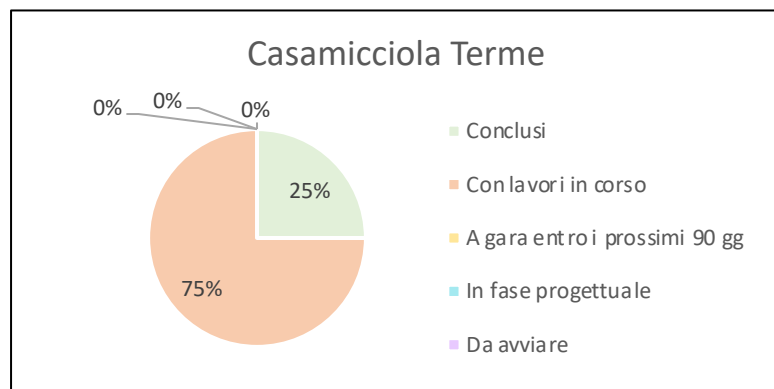




Sintesi stato di attuazione degli interventi post-frana Commissario Delegato

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

	Interventi Piano di Protezione Civile						Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania						Piano fanghi – Ordinanza Speciale Commissario Straordinario n.5 e 7						TOTALE COMPLESSIVO
	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare entro i prossimi 90 gg	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare entro i prossimi 90 gg	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare entro i prossimi 90 gg	In fase progettuale	Da avviare	Totale	
Casamicciola Terme	14	13	8	5	4	44	1	3				4	6	4		3	1	14	62
Lacco Ameno	7	1	7	4	2	21							3	1				4	25
Forio	12	2	5	5	2	26									1			1	27
Serrara Fontana	10	3	4	7	4	28													28
Ischia	15	1	3	2	13	34													34
Barano d'Ischia	4	2	10	8	9	33													33
Tutti i comuni dell'isola	1					1													1
TOTALE	63	22	37	31	34	187	1	3	0	0	0	4	9	5	1	3	1	19	210

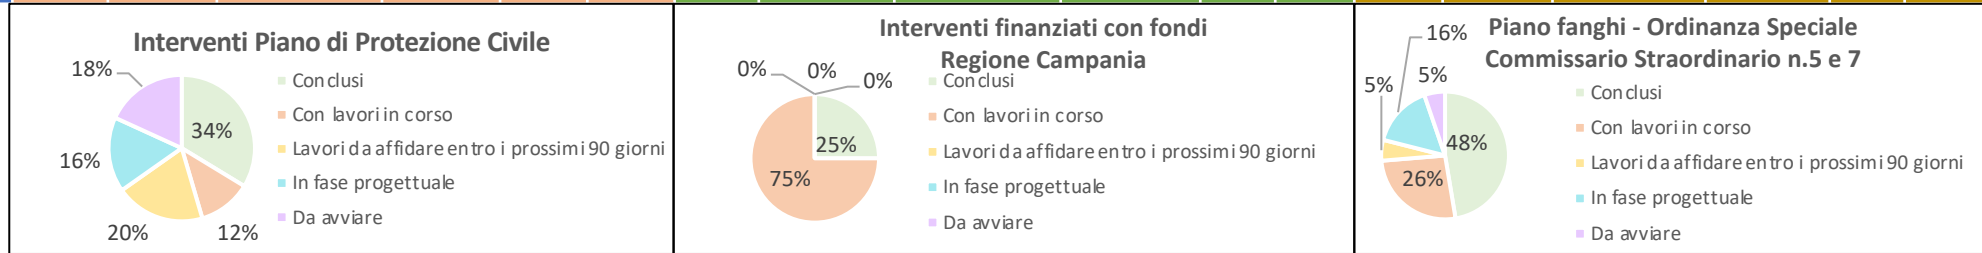

<p>Gli interventi programmati ed avviati a seguito dell'evento franoso del 26 novembre 2022, finanziati per complessivi € 93.394.270,56, sono suddivisi sulla base delle fonti di finanziamento, come di seguito indicato:</p> <p>A) 187 interventi compresi nel Piano del Dipartimento di Protezione Civile ODCPC 948/22 (stesura iniziale, 1° rimodulazione al 20/10/2023, 2° rimodulazione al 12/23):€ 68.204.174,94;</p> <p>B) 4 interventi finanziati con fondi Regione Campania (Deliberazione n. 624 del 29/11/2022) + economie dall'appalto di progettazione del ripascimento spiagge isola d'Ischia :€ 5.190.095,62;</p> <p>C) 19 interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 5-sexies, c. 1, del D.L. 186/2022 (Ordinanza Speciale n.5/23 – allegato 1, confluiti in Ordinanza Speciale n.7):€ 20.000.000,00;</p>	<p>TOTALE INTERVENTI: 210</p> <p>di cui:</p> <p>CONCLUSI:73</p> <p>CON LAVORI IN CORSO:30</p> <p>LAVORI DA AFFIDARE ENTRO 90 GIORNI:38</p> <p>IN FASE PROGETTUALE:34</p> <p>DA AVVIARE:35</p>	<p>Sintesi stato di attuazione degli interventi post-frana</p> <table border="1"> <tr><th>Stato</th><th>Percentuale</th></tr> <tr><td>Conclusi</td><td>35%</td></tr> <tr><td>Con lavori in corso</td><td>17%</td></tr> <tr><td>Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni</td><td>18%</td></tr> <tr><td>In fase progettuale</td><td>16%</td></tr> <tr><td>Da avviare</td><td>14%</td></tr> </table>	Stato	Percentuale	Conclusi	35%	Con lavori in corso	17%	Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	18%	In fase progettuale	16%	Da avviare	14%
Stato	Percentuale													
Conclusi	35%													
Con lavori in corso	17%													
Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni	18%													
In fase progettuale	16%													
Da avviare	14%													



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanza Speciale n.4 – Art. 5-ter STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

Elenco interventi piano commissariale di interventi urgenti

LEGENDA







	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		IN CORSO GARA PER PROGETTAZIONE

	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	ESEC LAV %
1	CS-01-S01	Vasca di espansione di circa 5000 mc, pulizia biomassa ed eventuali disgaggi	In corso affidamento progettazione	6.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 2	0
2	CS-02-S03	Realizzazione briglie a pettine	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
3	CS-03-S04	Realizzazione briglie, recupero briglie esistenti e briglia a gradoni	In corso affidamento progettazione	7.000.000,00 €		0
4	CS-04-S05	Vasca di espansione con briglia selettiva	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
5	CS-05-S06	Realizzazione vasca espansione con briglia selettiva e recupero briglie esistenti	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
6	CS-08-CE02a-b	Intervento di riduzione del rischio da flussi detritici in località Celario	In corso affidamento progettazione	9.000.000,00 €		0
7	CS-09-CE03	Inalveazione della cava a valle della località Celario fino all'incrocio con via Celario	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
8	CS-10-FO01	Inalveazione della cava a valle dell'incrocio con via Celario	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
9	CS-11-FO02	Realizzazione di una vasca di laminazione e di dissipazione nel tratto medio della cava Fontana	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
10	CS-12-FO03	Sistemazione del collegamento idraulico tra la via Santa Barbara e la cava Fontana.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
11	CS-13-FO04	Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell'intersezione con la cava Sinigallia.	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
12	CS-14-CU02	Interventi di mitigazione dell'impatto dei flussi detritici della cava Cuccufriddo.	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 1	0
13	CS-15-CU03	Miglioramento dell'officiosità idraulica del tratto tombato alla foce della cava Cuccufriddo	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
14	CS-16-CU04	Sistemazione idraulica della cava Cuccufriddo a valle fino alla tombatura	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
15	CS-17-MO02	Sistemazione idraulica della cava Del Monaco fino alla confluenza con la cava La Rita	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
16	CS-18-MO03	Briglie aperte nel tratto della cava Del Monaco subito a monte della confluenza con la cava La Rita	In corso affidamento progettazione	5.000.000,00 €		0
17	CS-19-F01	Intervento di rinforzo di circa 250 metri lungo l'asse longitudinale del fondo alveo; asportazione di circa 2000 mc di materiale, installazione di briglie.	In corso affidamento progettazione	5.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 3	0
18	CS-20-F03	Intervento di realizzazione briglie su circa 200 metri di alveo	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
19	CS-21-F04	Realizzazione vasca di accumulo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
20	CS-22-F06	Pulizia alveo e realizzazione briglie; ripristino briglie esistenti qualora possibile	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
21	CS-23-F08	Realizzazione vasca di accumulo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
22	CS-24-F09	Realizzazione barriera e soglie	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
23	CS-25-C01	Ripristino terrazzamenti e regimentazione acque con briglie	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
24	CS-26-C02	Realizzazione di briglia a pettine e interventi corticali	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
25	CS-27-N01	Rifacimento briglia, rimozione materiale e sistemazioni	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
26	CS-28-N02	Realizzazione gradonata, briglie, stabilizzazione versanti e pulizia biomassa con eventuali disgaggi	In corso affidamento progettazione	6.000.000,00 €		0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		IN CORSO GARA PER PROGETTAZIONE






	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	ESEC LAV %
27	CS-29-P01	Sistemazione del reticolo idraulico e vasca di espansione di circa 1000 mc	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 4	0
28	CS-30-P02a	Intervento con 10 soglie;	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
29	CS-31-P03	Vasca con griglie a pettine sul lato di valle	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
30	CS-32-MO01	Pulizia e ripristino delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 5	0
31	CS-33-MO04	Sistemazione dei fossi minori presenti nel bacino della cava La Rita-Cuccufrippo-Del Monaco	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
32	CS-34-S02	Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 6	0
33	CS-35-F02	Intervento di rinforzo corticale con estensione di circa 100 metri di lunghezza e circa 50 metri di sviluppo di pendio, pulizia biomassa ed eventuali disgaggi	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 7	0
34	CS-36-F07	Interventi di consolidamento di circa 4000 mq di pendio	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
35	CS-37-F10	Pulizia alveo, rimozione materiale ed interventi di stabilizzazione pendii	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
36	CS-38-P02b	Sistemi soil nailing con reti aderenti per i pendii maggiormente acclivi, rinverdimento incluso.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 8	0
37	CS-39-P02c	Intervento di rinforzo lungo circa 200 metri circa di fondo alveo e altezza di pendii fino a 20 metri comprensivo di pulizia biomassa e disgaggi.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
38	CS-40-IC02	Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale	In corso progettazione	1.000.000,00 €	Affidamento diretto	0
39	CS-41-IC04	Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 9	0
40	CS-42-IC05	Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 10	0
41	CS-43-CU01	Sistemazione e pulizia del tratto montano della cava Cuccufrippo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €	Affidamento diretto	0
42	CS-44-F05	Intervento di disgaggio e trasporto della biomassa	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €	Inserito in gara opera 11	0
43	CS-45-IC01	Cartografia di base	In corso progettazione	100.000,00 €	Affidamento al corpo forestale dei carabinieri	0
44	CS-46-IC03	Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 12	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ulteriori interventi da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola
compresi nel piano approvato con l'Ordinanza Speciale n.4
(PFTE redatto da SMA)

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-52-CD-CT-2-010	Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella	Assegnato al Comune di Casamicciola Terme con Ordinanza Speciale n.7. Potrebbe avere i lavori affidati entro 90 giorni	496.967,77 €	5
CS-54-CD-CT-2-020	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia	Assegnato al Comune di Casamicciola con Ordinanza Speciale n.7 – Potrebbe avere i valori affidati entro 90 giorni	1.710.072,53 €	5
CS-55-CD-CT-2-021	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva	In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016	653.048,01 €	5
CS-56-CD-CT-2-022	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello	In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016	896.699,15 €	5
CS-57-CD-CT-2-023	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Bainsano	In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016. E' stato finanziato con il Piano ex OCDPC 948/22. Il Soggetto attuatore individuato è il Commissario delegato.	914.604,77 €	5
CS-63-CD-CT-1-039	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito - Primi interventi di messa in sicurezza	In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016. Di prossima individuazione il Comune di Casamicciola Terme come Soggetto attuatore.	945.000 €	5
CD-CT-1-009	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Assegnato al Comune di Casamicciola con Ordinanza Speciale n.7 - Potrebbe avere i valori affidati entro 90 giorni	473.945,75 €	5
CD-CT-1-015	Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 - Primi interventi di messa in sicurezza	Inserito nella richiesta di nuova rimodulazione presentata al DPC all'interno del Piano ex OCDPC 948/2022 – in attesa di approvazione. Il Soggetto attuatore individuato è il Comune di Casamicciola Terme. In corso progettazione.	131.713,20 €	5



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-CT-01	Casamicciola Terme	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleon" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	5.359.768,47 €	0
CS-OS-CT-02	Casamicciola Terme	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.195.409,42 €	0
CS-OS-CT-03	Casamicciola Terme	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	1.968.118,40 €	0
CS-OS-CT-04	Casamicciola Terme	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.927.252,80 €	0
CS-OS-CT-05	Casamicciola Terme	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	Agenzia del Demanio	In corso Progettazione	7.512.535,73 €	0
CS-OS-CT-06	Casamicciola Terme	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	4.428.999,92 €	0
CS-OS-CT-07	Casamicciola Terme	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	5.239.280,00 €	0
CS-OS-CT-08	Casamicciola Terme	Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	12.044.419,20 €	0
CS-OS-CT-09	Casamicciola Terme	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.082.058,70 €	0
CS-OS-CT-10	Casamicciola Terme	Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	3.139.421,57 €	0



Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-	Casamicciola Terme	REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.544.564,25 €	0
CD-CT-	Casamicciola Terme	Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	545.095,20 €	0

Comune di Forio

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-	Forio	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	Comune di Forio	Concluso	489.864,2 €	100

Tutti i comuni dell'isola

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-	Tutti i comuni dell'isola	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie.	Commissario Straordinario	Da avviare	3.000.000,00 €	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

LEGENDA

 LAVORI IN CORSO	 PROGETTAZIONE IN CORSO
 CONCLUSO	 DA AVVIARE
 LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG	

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-FO-01	Forio	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	Comune di Forio	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	2.200.000,00 €	0
CS-OS-FO-03-A	Forio	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Lotto – 2° Stralcio – Lavori di somma urgenza	Comune di Forio	In corso lavori	536.000,00 €	95
CS-OS-FO-03-B	Forio	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Lotto	Comune di Forio	In corso Progettazione	6.585.196,25 €	0
CS-OS-FO-04	Forio	Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristofaro Mennella"	Comune di Forio	In corso Progettazione	1.320.158,38 €	0

Comune di Lacco Ameno

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-LA-01	Lacco Ameno	Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma.	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	5.113.147,24 €	0
CS-OS-LA-02	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico G. Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein)	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	4.600.000,00 €	0
CS-OS-LA-04-A	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. PROGETTAZIONE	Agenzia del Demanio	In corso Progettazione	1.738.197,21 €	0
CS-OS-LA-04-B	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. CUSTODIA REPERTI ARCHEOLOGICI	Diocesi di Ischia	Da avviare	115.000 €	0
CS-OS-LA-04-C	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. ESECUZIONE LAVORI	Comune di Lacco Ameno	Da avviare	9.364.002,80 €	0
CS-OS-LA-05A	Lacco Ameno	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma – Lotto torre	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.429.964,44 €	0
CS-OS-LA-05B	Lacco Ameno	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.973.669,81 €	0
CS-OS-LA-06	Lacco Ameno	Opere complementari per l'adequamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	732.000,00 €	0



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA

Ord. Speciale n. 1 – 7 - Focus sullo stato di avanzamento degli interventi

Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

COCIDE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
		Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini		PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-CT-01	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleon" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	5.359.768,47 €	- €	100%										
CS-OS-CT-02	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	3.195.409,42 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-CT-03	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	1.968.118,40 €	- €	100%	100%	10%								
CS-OS-CT-04	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.	1.927.252,80 €	26.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%			
CS-OS-CT-05	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	7.512.535,73 €	- €	100%	100%									
CS-OS-CT-06	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo - CUP: G34I19000740001	4.428.999,92 €	65.112,50 €	100%	100%	100%			100%	100%	50%			
CS-OS-CT-07	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	5.239.280,00 €	- €	100%	100%	10%								
CS-OS-CT-08	Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione	12.044.419,20 €	- €	100%	100%									
CS-OS-CT-09	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello	1.082.058,70 €	36.980,36 €	100%	100%	100%			100%	100%	50%			
CS-OS-CT-10	Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	3.139.421,57 €	83.831,28 €	100%	100%	100%								
	REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI	3.544.564,25 €	- €	100%	100%	100%								
	Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz	545.095,20 €	- €	100%							100%	10%		



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA Ord. Speciale n. 2 - Comune di Lacco Ameno

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

		QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
COCIDE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziato	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo	Opera conclusa
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-LA-01	Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma.	5.113.147,24 €	88.343,37 €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-02	Intervento di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico Giorgio Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein) - Lacco Ameno colpito dal sisma	4.600.000,00 €	88.713,38 €	100%	100%	100%			100%					
CS-OS-LA-04	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma.	11.217.200,01 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-LA-05A	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma	1.429.964,44 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-05B	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma – lotto costone	1.973.669,81 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-06	Opere complementari per l'adequamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma del 21 agosto 2017	732.000,00 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA Ord. Speciale n. 3 - Comune di Forio

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia


Commissario Delegato emergenza Ischia

		QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
COCIDE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo	Opera conclusa
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-FO-01	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	2.200.000,00 €	- €	100%	100%	100%	100%	100%						
CS-OS-FO-03	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Stralcio.	7.121.196,25 €	- €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-FO-04	Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristofaro Mennella"	1.320.158,38 €	- €	100%	100%	100%	100%	100%						
Forio	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	489.864,20 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

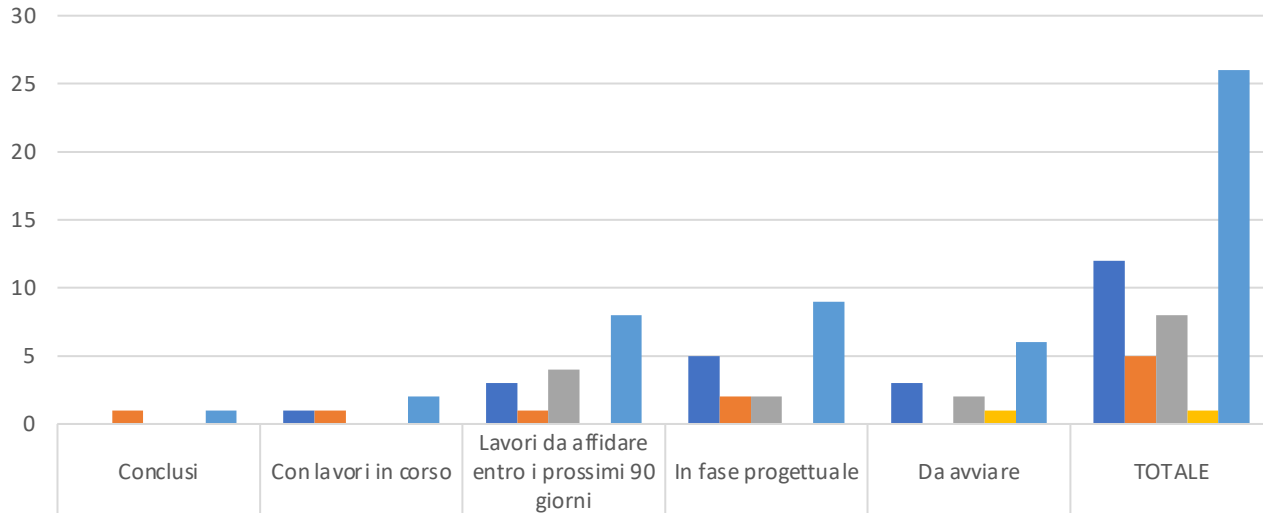


■ Casamicciola Terme	0	1	3	5	3	12
■ Forio	1	1	1	2	0	5
■ Lacco Ameno	0	0	4	2	2	8
■ Tutti i comuni dell'isola	1	2	8	9	6	26
■ TOTALE	1	2	8	9	6	26

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze Speciali e ripartiti per comune di ubicazione

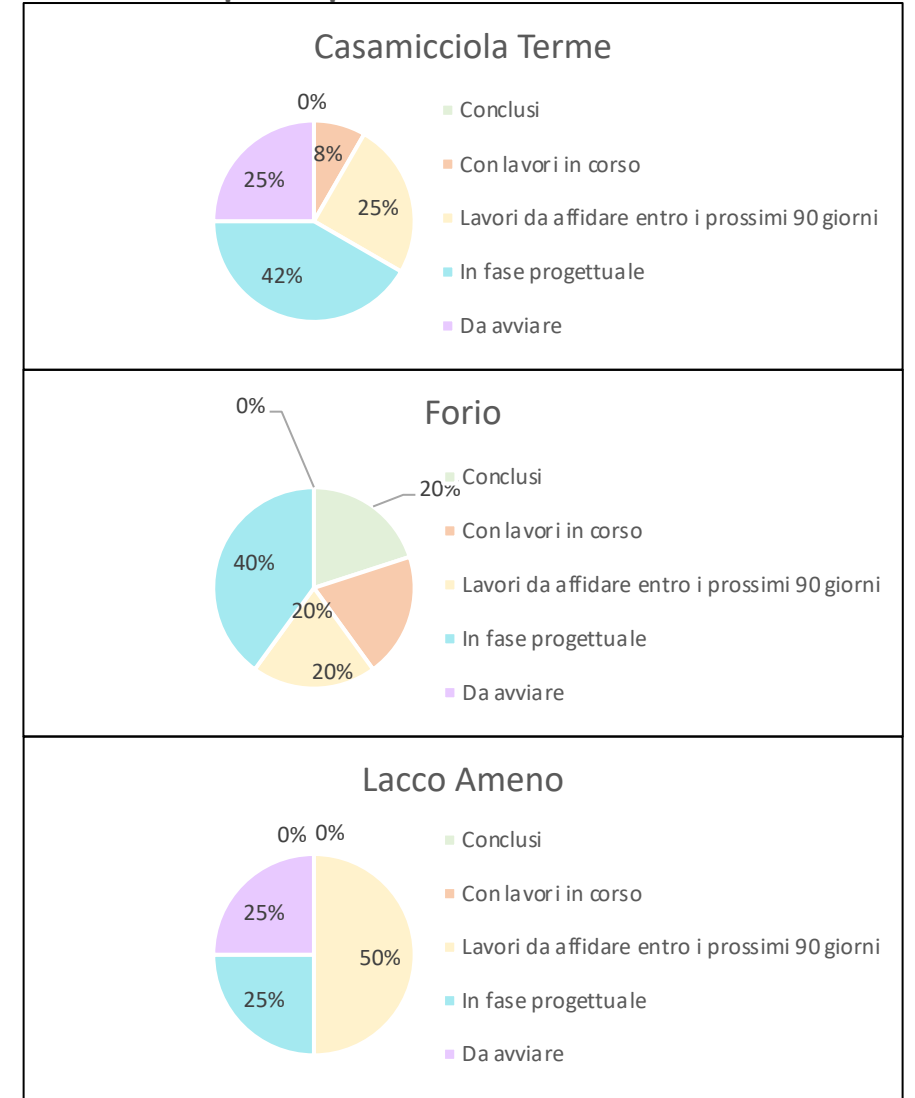



Ordinanze n. 9 – 11 – 14 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia




Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
OP-LA-04	Lacco Ameno	Messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Montevico	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	446.015,27 €	0
PS-LA-03	Lacco Ameno	Istituto comprensivo Mennella (Scuola elementare + scuola materna) di via Pannella		Da avviare	1.648.963,01 €	0
OP-CM-01-1	Casamicciola Terme	Lavori di ricostruzione del muro di contenimento posto a confine con la ex S.S. 270 (Isola Verde) KM 25 + 700	Città Metropolitana	In corso Progettazione	3.520.000,00 €	0
OP-CM-01-2	Casamicciola Terme	Camera di Manovra adiacente il Serbatoio idrico di Casamicciola scheda Aedes Esito EF	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	302.241,06 €	30
OP-RC-01	Casamicciola Terme	Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (completamento intervento urgente 01/U/01-)	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	506.181,14 €	100
OP-CT-03	Casamicciola Terme	Ripristino e messa in sicurezza di via Gran Sentinella e via lasolino	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	60.000,00 €	50
PS-CAS-04	Casamicciola Terme	Scuola elementare De Gasperi	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	309.356,73 €	100
PS-CAS-07	Casamicciola Terme	Edificio ex sede Centro per l'impiego	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	614.440,00 €	0
PS-CAS-02	Casamicciola Terme	Istituto superiore Mattei	Città Metropolitana	In corso Progettazione	5.100.000,00 €	0
PS-FOR-01	Forio	Istituto comprensivo Forio 2 - D'Abundo	Comune di Forio	In corso lavori	1.997.456,48 €	30
PS-FOR-02	Forio	Istituto comprensivo Forio 1 - Luca Bassofiore	Comune di Forio	In corso lavori	4.120.794,84 €	10


Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze n. 9 – 11 e 14 e ripartiti per comune di ubicazione

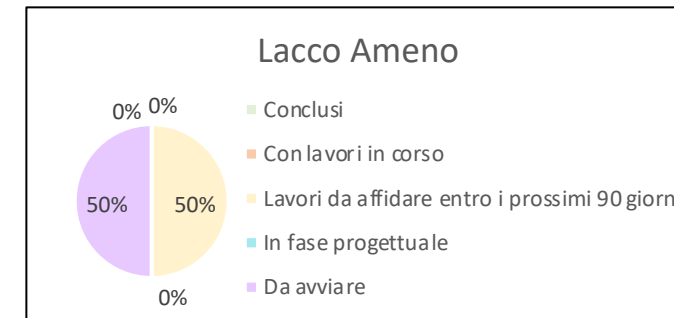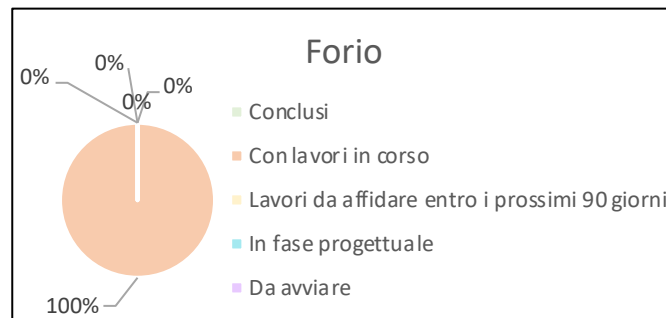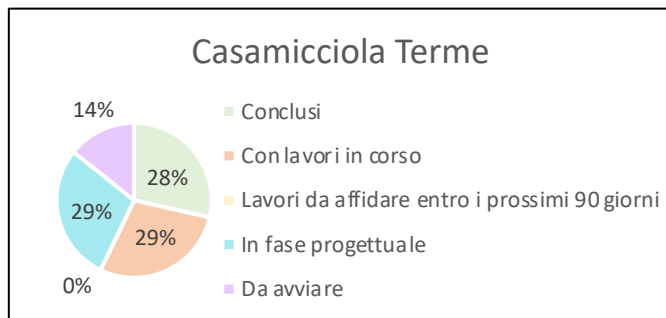




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Sintesi complessiva stato di attuazione interventi post sisma

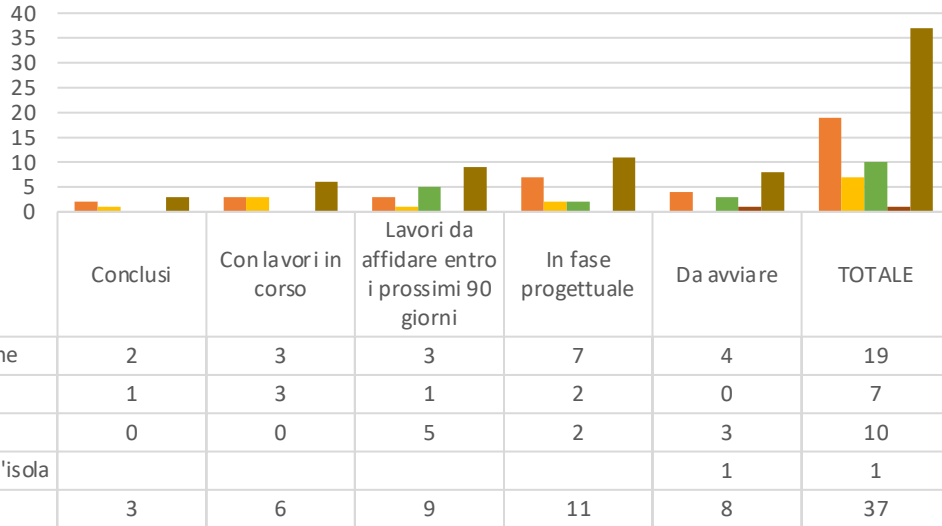


Sintesi complessiva stato di attuazione interventi post sisma

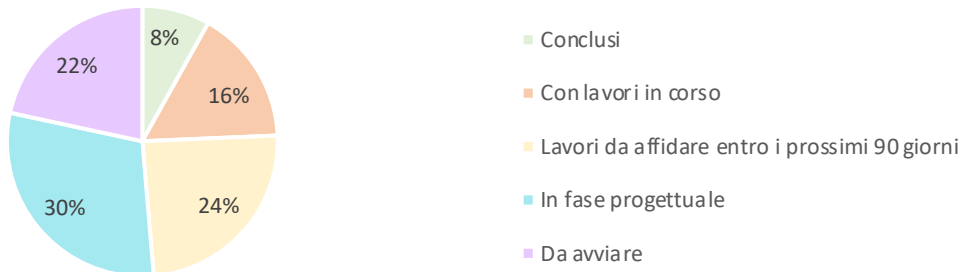


Sintesi stato di attuazione interventi post sisma (Ordinanze Speciali nn.1, 2, 3, 5 e 7 e Ordinanze nn.9, 11 e 14) ripartiti per comune


Casamicciola Terme



Forio

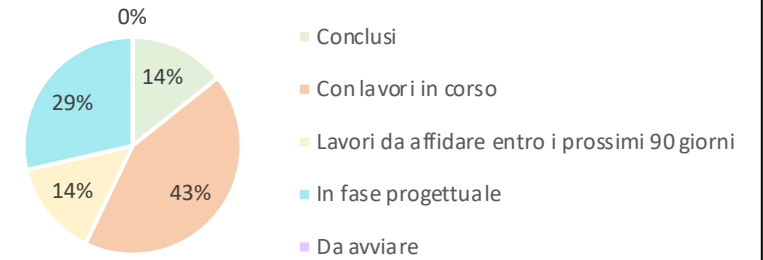

Lacco Ameno

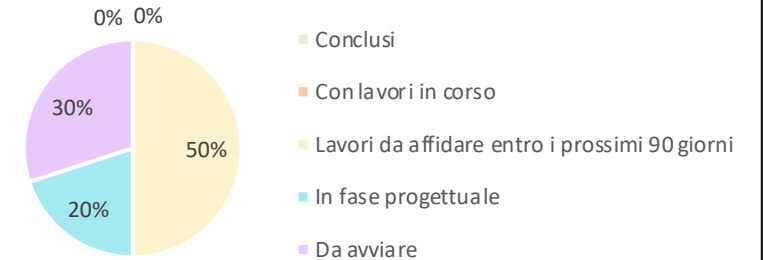



Ordinanza Speciale n.6 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI EDIFICI DI CULTO

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	Note	ESEC LAV %
BC-CA-05	Casamicciola Terme	Chiesa Sant'Antonio da Padova		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	703.984,56 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-03	Casamicciola Terme	Chiesa San Pasquale Baylon		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.003.422,96 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-01	Forio	Chiesa Santa Lucia		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	440.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-05	Forio	Chiesa San Domenico		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	300.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-02	Lacco Ameno	Chiesa San Giuseppe al Fango		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	2.594.297,79 €	Stazione appaltante: Comune di Lacco Ameno poi Diocesi di Ischia	0
BC-CA-01	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio		In corso Progettazione	890.646,32 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-02	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria della Pietà		In corso Progettazione	1.332.522,12 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-07	Casamicciola Terme	Chiesa Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio		In corso Progettazione	514.938,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-03	Forio	Chiesa parrocchiale di San Sebastiano		In corso Progettazione	714.721,65 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-04	Forio	Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio		In corso Progettazione	1.527.487,58 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-01	Lacco Ameno	Chiesa della SS. Annunziata		In corso Progettazione	825.646,01 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-05	Casamicciola Terme	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena		In corso Progettazione	5.550.361,00 €	Stazione appaltante: Comune C.T.	0
BC-CA-06	Casamicciola Terme	Chiesa dell'Immacolata		In corso Progettazione	1.450.000,00 €	Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC	0
BC-FO-02	Forio	Chiesa di Santa Maria di Loreto		In corso Progettazione	1.900.000,00 €	Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC	0
BC-CA-000	Casamicciola Terme	Chiesa di San Giuseppe - Don Orione		In corso Progettazione	1.303.549,87 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-000	Lacco Ameno	Chiesa Maria Assunta in cielo		In corso Progettazione	820.579,11 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-000	Forio	Chiesa di San Francesco d'Assisi		In corso Progettazione	603.433,05 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
